
Поставка оборудования радиосвязи · **дорожная карта**

T0 — вступление Договора в силу · A — аванс · S — отгрузка · ДП — Дата поставки (Акт входного контроля) · все сроки в днях от T0 · суммы USD

1 884 766 USD

3 партии · 56 комплектов · последняя поставка T0 + 194 дн

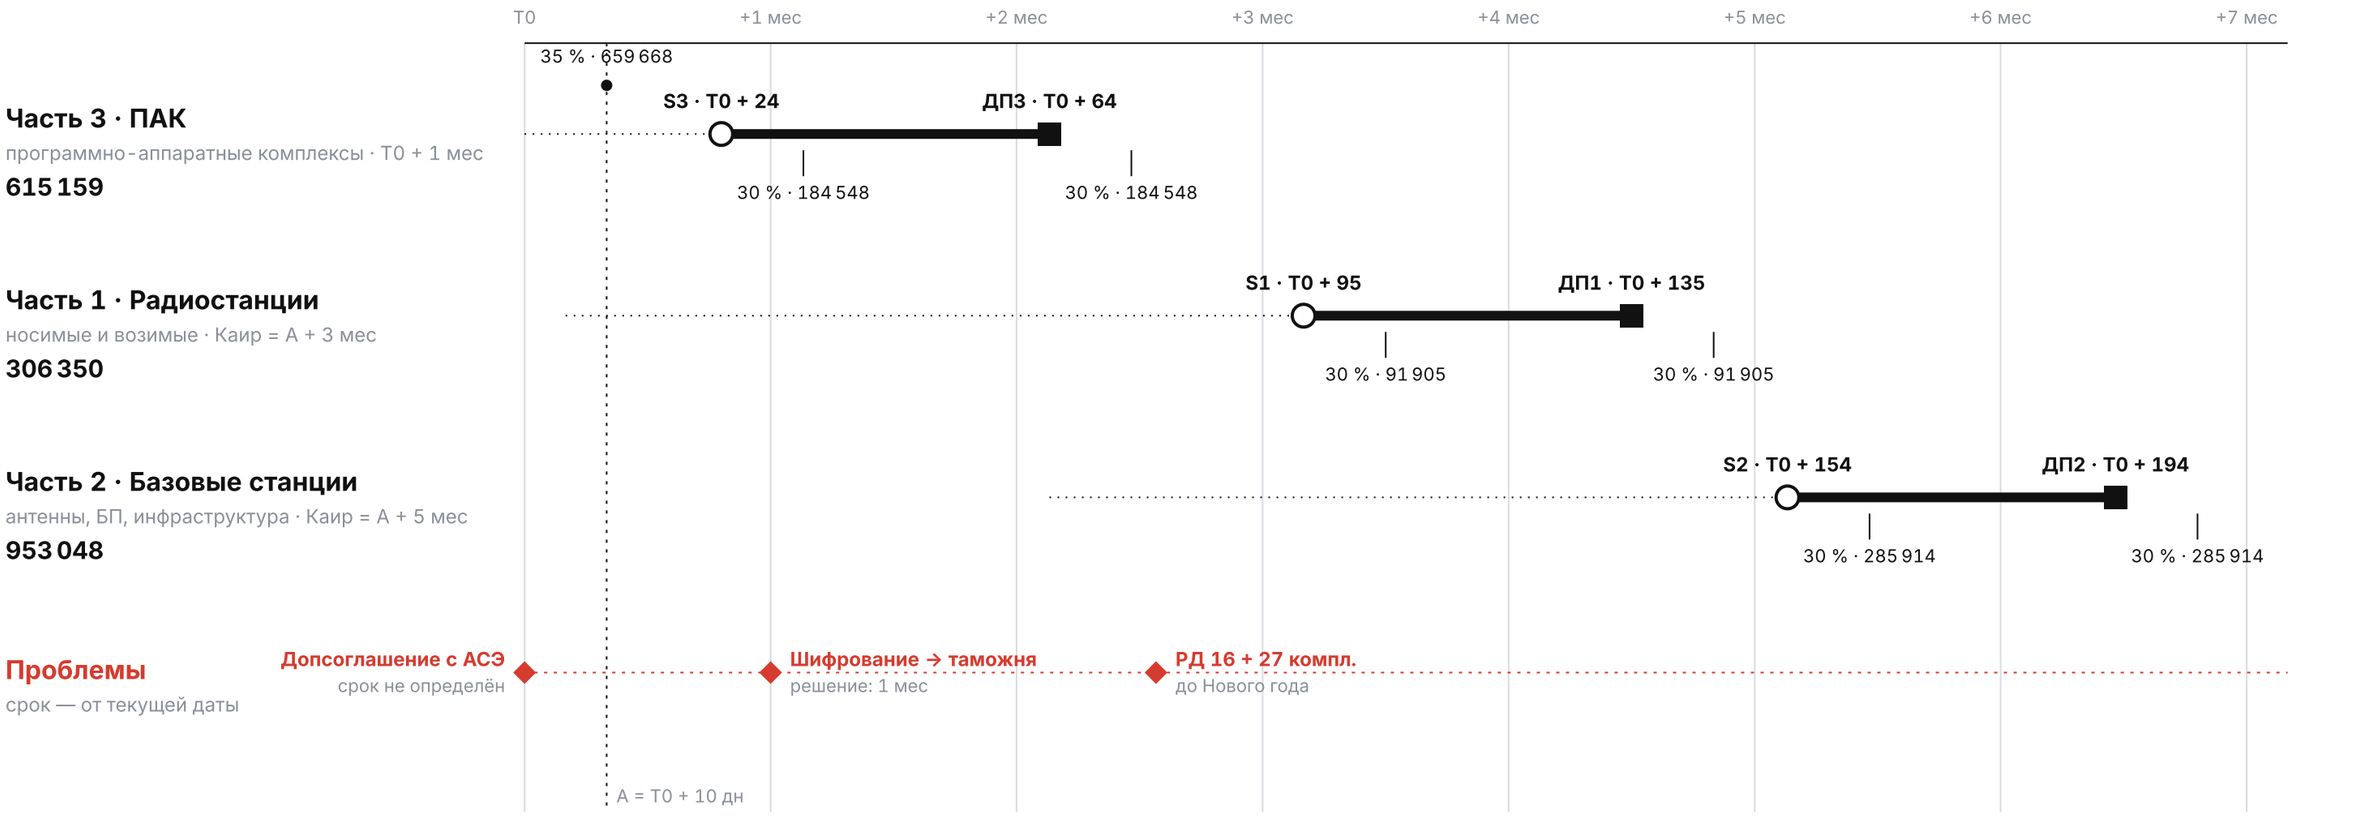

ЦИКЛ ОДНОЙ ПАРТИИ · ОТ ДАТЫ ОТГРУЗКИ S

S − 90	уведомление об отгрузке, старт изготовления
S − 30	готовность, заводские испытания, заявление в NTRA на ввоз
S − 20	приёмочная инспекция FAT на заводе
S − 1	разрешение Заказчика на отгрузку, ACID, полис
S	**отгрузка** · S + 1 акт о переходе права собственности
S + 7	прибытие в Каир, авиа
S + 30	прибытие на Площадку, разрешение NTRA на ввоз
S + 40	**Акт входного контроля = Дата поставки**

ПЛАТЕЖИ · СТ. 23

35 %	аванс · A = T0 + 10 дн · 659 668
30 %	по каждой партии · S + 10 дн · всего 565 430
30 %	по каждой партии · ДП + 10 дн · всего 565 430
5 %	по Блоку · Акт сдачи-приёмки + 30 дн · 94 238
Услуги	FAT, анализатор спектра, сборы NTRA · 10 210

ПРОБЛЕМЫ

1 мес	шифрование радиооборудования влияет на таможенный выпуск
до НГ	разработка 16 и согласование 27 комплектов РД
—	допсоглашение с АСЭ: подготовка и согласование

КОМАНДИРОВКА В КИТАЙ · HYTERA

1. Окончательное согласование технического решения
2. Решение по АФУ по параметрам NTRA, вместе с инженерами Hytera
3. Сертификат проектировщика от Hytera
4. Проверка избыточности или дефицита лицензий

Источник: График изготовления и поставки, Дополнение 1.2 к Приложению № 1 · суммы по Спецификации, к пересчёту в EGP

месяц на шкале = 30 дн · ○ отгрузка · ■ Дата поставки · ◆ проблема
