
Поставка оборудования радиосвязи · **дорожная карта**

T0 — вступление Договора в силу · A — аванс · S — отгрузка · ДП — Дата поставки (Акт входного контроля) · все сроки в днях от T0 · суммы USD

1 884 766 USD

3 партии · 56 комплектов · последняя поставка T0 + 194 дн

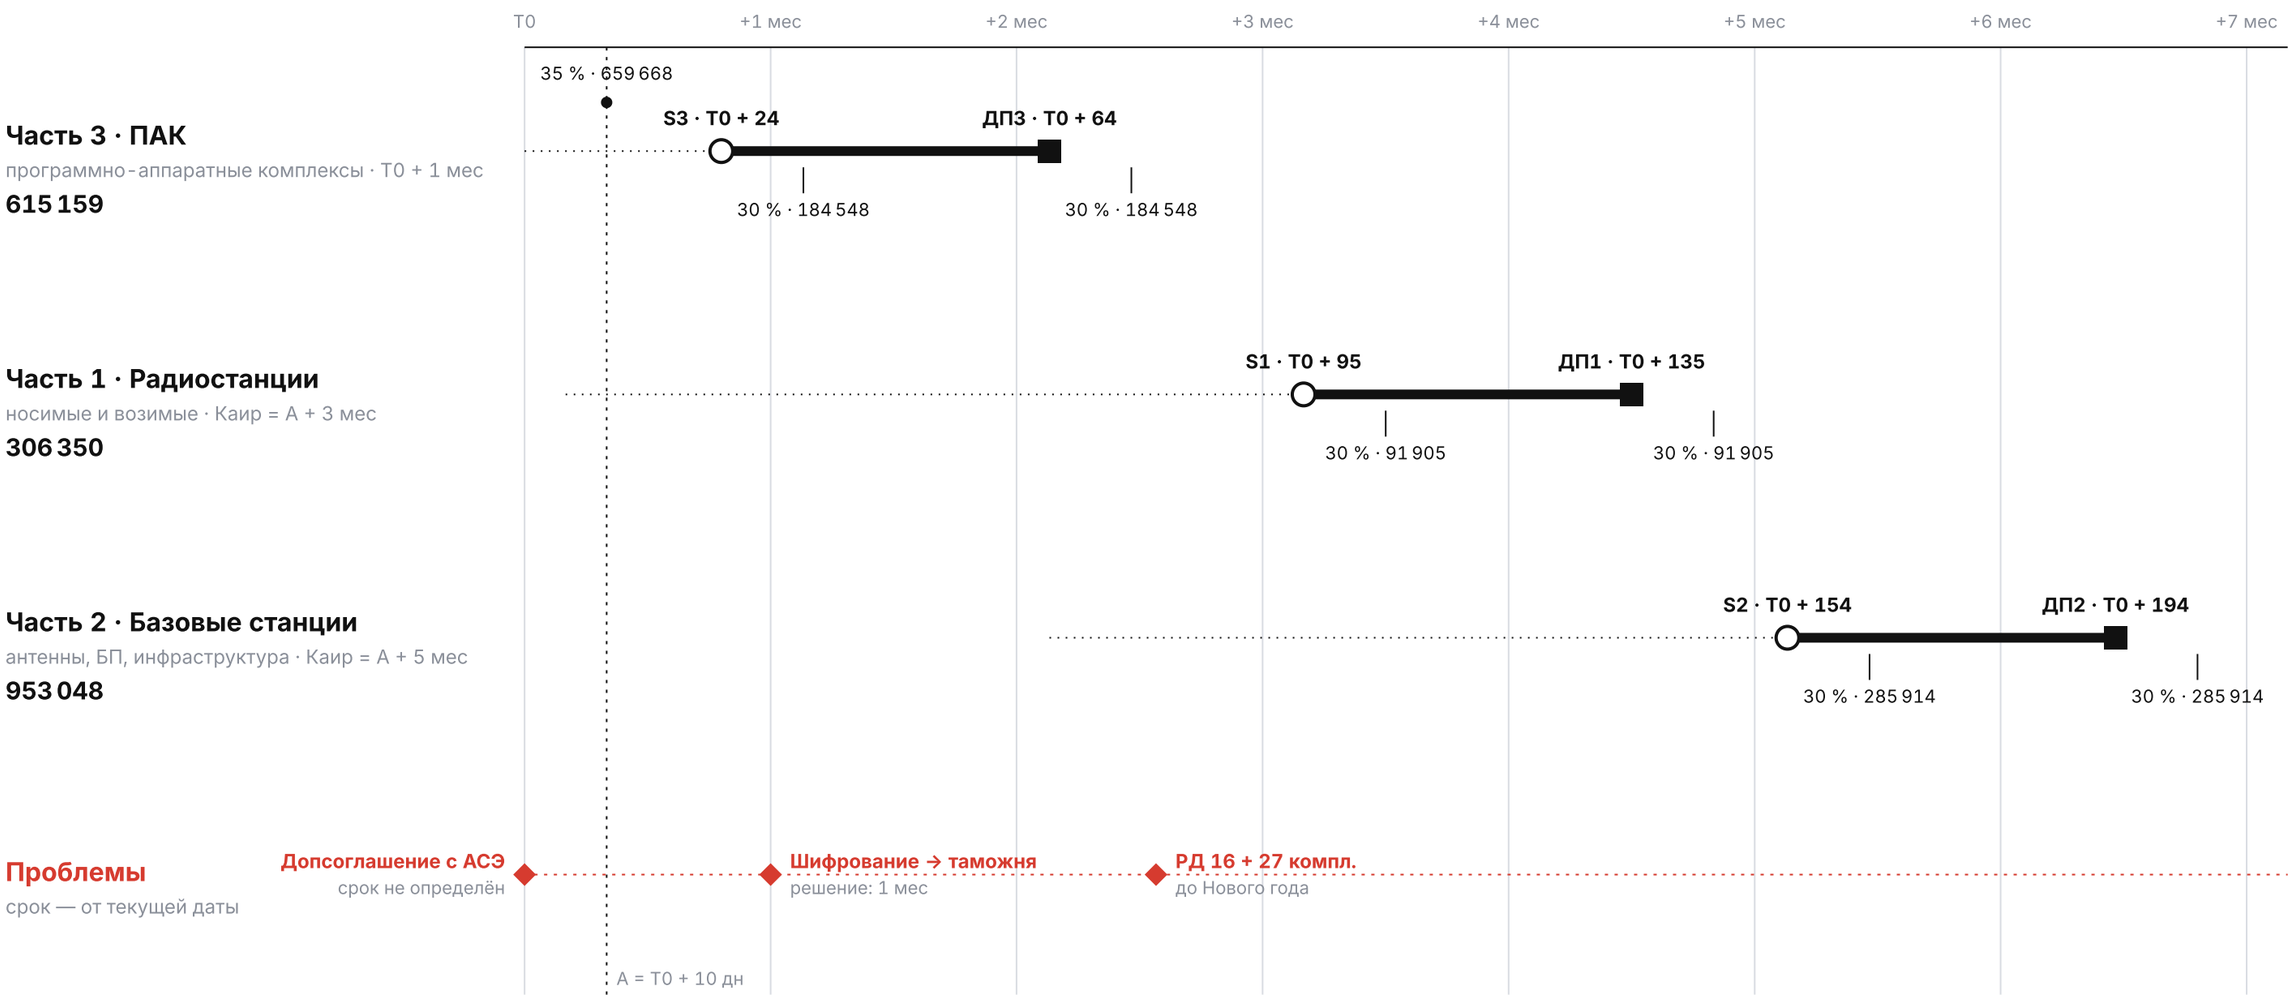

ПРОБЛЕМЫ

1 мес	шифрование радиооборудования влияет на таможенный выпуск
до НГ	разработка 16 и согласование 27 комплектов РД
—	допсоглашение с АСЭ: подготовка и согласование

КОМАНДИРОВКА В КИТАЙ · HYTERA

1. Окончательное согласование технического решения
2. Решение по АФУ по параметрам NTRA, вместе с инженерами Hytera
3. Сертификат проектировщика от Hytera
4. Проверка избыточности или дефицита лицензий

Источник: График изготовления и поставки, Дополнение 1.2 к Приложению № 1 · суммы по Спецификации, к пересчёту в EGP

месяц на шкале = 30 дн · ○ отгрузка · ■ Дата поставки · ◆ проблема
