Дорожная карта поставки оборудования оперативной радиосвязи

Упрощённая схема по Графику изготовления и поставки (Дополнение 1.2 к Приложению № 1). Все сроки — относительные: **Т0** вступление Договора в силу · **А** получение аванса · **S** Дата отгрузки · **ДП** Дата поставки (Акт входного контроля). Суммы — USD по Спецификации.

1 884 766 USD — Цена по Спецификации (к пересчёту в EGP)


3 партии · 56 компл. — + комплекс услуг (FAT, сборы NTRA)

90 + 30 + 10 дн — изготовление · доставка до Площадки · входной контроль

35 / 30 / 30 / 5 % — аванс · после отгрузки · после Акта ВК · окончательный

1 Сводная карта: все партии и платежи относительно Т0

масштаб — календарные дни от вступления Договора в силу; месяц ≈ 30 дн

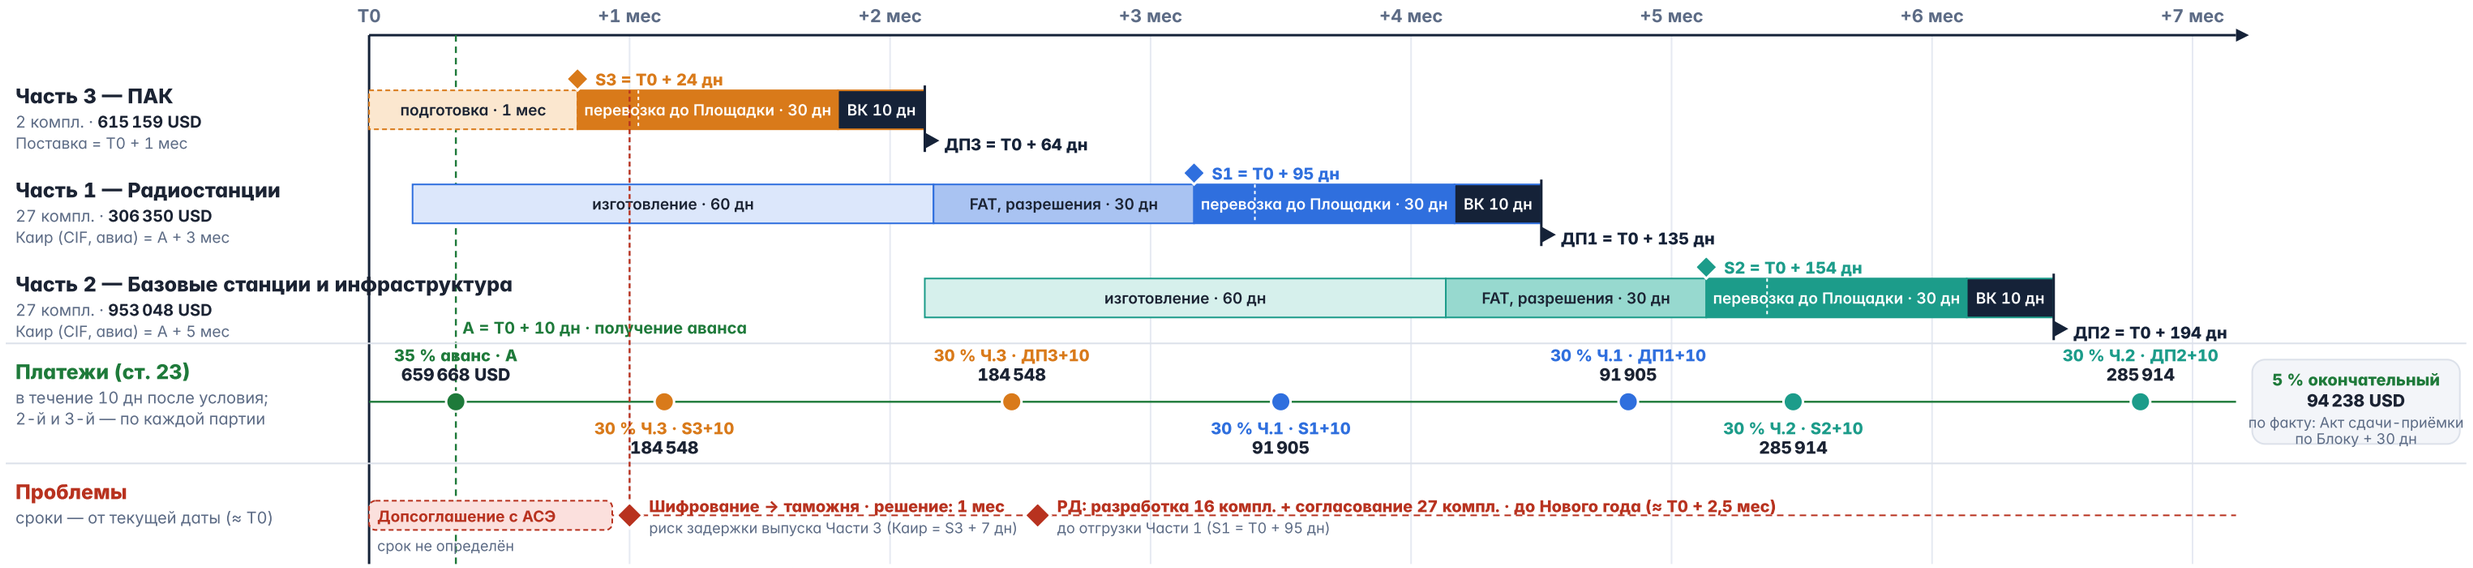

Комплекс услуг 10 210 USD оплачивается в тех же долях (30 % = 3 063 USD) и на маркерах не показан. Пунктирная засечка внутри перевозки — прибытие в Каир (S + 7 дн, авиа).

2 Типовой цикл одной партии: все события относительно Даты отгрузки S

S — приём грузовых мест первым перевозчиком; одинаков для Части 1, 2 и 3

S − 90 дн
Уведомление об отгрузке (Прил. № 11)
Старт изготовления на заводе
Подтверждение стоимости перевозки
Подрядчик

S − 60 дн
Уведомление о тяжеловесных / крупногабаритных грузах (п. 8.14)
Подрядчик

S − 30 дн
Завершение изготовления, заводские испытания
Копии Type Approval NTRA (п. 8.6)
Заявление в NTRA на разрешение на ввоз
Подрядчик

S − 20 дн
Приёмочная инспекция (FAT) на заводе, г. Шэньчжэнь, с участием Заказчика
Данные для страхования груза (п. 8.1)
Подрядчик · Заказчик

S − 15 … 14 дн
Удостоверение о приёмочной инспекции (EN-004)
Документы для лицензии NTRA на частоты
Сканы отгрузочных документов, заявка на проформу
Стороны

S − 1 дн · стоп-точка
ACID-номер для транспортных документов
Письменное разрешение на отгрузку
+ копия страхового полиса
Заказчик

S · ДАТА ОТГРУЗКИ
Приём грузовых мест первым перевозчиком
S+1: копия транспортного документа,
Акт о переходе права собственности
Подрядчик · платёж

S + 7 дн
Прибытие в аэропорт Каира
(CIF Каир, авиа; оценочный срок)
Подрядчик

S + 30 дн
Прибытие на Строительную площадку
Передача разрешения NTRA на ввоз
(не позднее прибытия)
Подрядчик

S + 40 дн · ДАТА ПОСТАВКИ
Входной контроль, Акт ВК без замечаний
Передача документации (Прил. № 3)
Старт гарантийного периода
Стороны · платёж

ИЗГОТОВЛЕНИЕ · 60 дн | ИСПЫТАНИЯ · FAT · РАЗРЕШЕНИЯ NTRA · 30 дн | ПЕРЕВОЗКА (авиа → Каир → Площадка) · 30 дн | ВК · 10 дн

3 Партии поставки и суммы

USD по Спецификации

Часть 1 — Радиостанции — **306 350 USD**
Носимые HP709C / HP789C, возимые HM789C, батареи, лицензии, ЗУ
27 компл. Каир = А + 3 мес S1 = Т0+95 · ДП1 = Т0+135 дн

Часть 2 — Базовые станции и инфраструктура — **953 048 USD**
БС DS-6250 с антеннами, БП, антенны VHF, волноводы, настольные компл.
27 компл. Каир = А + 5 мес S2 = Т0+154 · ДП2 = Т0+194 дн

Часть 3 — ПАК — **615 159 USD**
ПАК 90CZS02 (осн.) и 90CZS03 (рез.): серверы, АРМ, коммутаторы, ПО
2 компл. Поставка = Т0 + 1 мес S3 = Т0+24 · ДП3 = Т0+64 дн

Комплекс услуг — анализатор спектра, FAT, сборы NTRA — **10 210 USD**

ИТОГО по Спецификации — **1 884 766 USD**

4 Платежи по ст. 23 Договора

доля от Цены · условие · срок

35 % аванс	30 % после отгрузки	30 % после Акта ВК	5 %
659 668	565 430	565 430	94 238

Аванс · 35 % — **659 668 USD**
Обеспечения возврата аванса и исполнения Договора (≥ 5 раб. дн до платежа); счёт
10 кал. дн от вступления в силу → А = Т0 + 10 дн

Второй · 30 % — **565 430 USD**
Удостоверение о приёмочной инспекции; разрешение на отгрузку; копия транспортного документа
10 кал. дн · по каждой партии (первая — Часть 3) → S + 10 дн

Третий · 30 % — **565 430 USD**
Акт ВК без замечаний + документы по п. 23.3; не ранее 10 раб. дн после оплаты Ген. заказчиком
10 кал. дн, не позднее 75 дн от Акта · по партии → ДП + 10 дн

Окончательный · 5 % — **94 238 USD**
Акт сдачи-приёмки Оборудования по Блоку; действующее Обеспечение исполнения Договора
30 кал. дн · по каждому Блоку после Акта Собственника об Этапе СФ3

30 % по партиям (2-й и 3-й платёж, каждый): Ч.1 91 905 · Ч.2 285 914 · Ч.3 184 548 · услуги 3 063

5 Проблемы и открытые вопросы

сроки — от текущей даты

ПРОБЛЕМЫ

Шифрование радиооборудования — решение: 1 мес
влияет на выпуск из таможни Египта

Рабочая документация (РД) — до Нового года
разработка 16 комплектов + согласование 27 комплектов

Дополнительное соглашение с АСЭ — срок не определён
подготовка и согласование

ВОПРОСЫ К РЕШЕНИЮ В КОМАНДИРОВКЕ В КИТАЙ (HYTERA)

1. Окончательное согласование всего технического решения
2. Разработка с инженерами Hytera решения по АФУ по параметрам NTRA
3. Получение сертификата проектировщика от Hytera
4. Проверка избыточности или дефицита лицензий

изготовление · испытания и разрешения · перевозка · входной контроль · платёж

Источник: График изготовления и поставки (Дополнение 1.2 к Приложению № 1), Modified_Nept_list_13-10-2026. Суммы USD по Спецификации (к пересчёту в EGP). Сроки — календарные дни; месяц на шкале = 30 дн.
